



PROVINCIA DI NUORO

ZONA OMOGENEA DELL'OGLIASTRA

SETTORE AMBIENTE TERRITORIO VIABILITA' - SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGIASTRA

OP.007b COMPLETAMENTO SVINCOLO DI CEA TRA STRADA CONSORTILE - SS 125 - NUOVA SS 125

(cod. RAS VL_LLP_193 CUP J31B19000080002)



PROGETTO ESECUTIVO

PSC – CRONOPROGRAMMA		All.	
		L₄	
Finanziamento: RAS – ASSESSORATO DEI LL.PP. - <i>Fondi FSC 2014-2020/CIPE 26/2016</i>			
PROGETTAZIONE: Ing. Mauro Foddis	Responsabile del Procedimento: Ing. Rosetta Demurtas	REV:	DATA 1 settembre 2022
		SCALA:	
		Codici Progetto:	
		RAS: VL_LLP_193	PROV: OP.007b

ALLEGATO "A"

Comune di Bari Sardo
Provincia di NU

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Completamento svincolo di CEA tra Strada Consortile - SS125 - Nuova SS125 CUP J31B19000080002

COMMITTENTE: Provincia di Nuoro

CANTIERE: bivio CEA, Bari Sardo (NU)

Bari Sardo, li 01/09/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ing. Foddis Mauro)


IL COMMITTENTE
(\$Empty_COM_11\$ \$Empty_COM_10\$ Provincia di Nuoro)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$


Ing. Foddis Mauro
Via Mameli
08048 Tortoli (\$Empty_CSP_08\$)
0784.238909 - \$Empty_CSP_10\$
\$Empty_CSP_11\$

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3			
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
sistemazione cedimenti rilevati e opere d'arte	17 g			[Gantt bar from week 1 to week 14]																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g																			Z1	
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g																				Z1
Scavo a sezione ristretta	1 g																				Z1
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	1 g		Z1																		
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g		Z1																		
Risezionamento del profilo del terreno	1 g		Z1																		
Rinterro di scavo	1 g																				
Formazione di manto di usura e collegamento	1 g																				
Smobilizzo del cantiere	1 g		Z1																		
Bitumi	22 g																				
Allestimento cantiere	14 g																				
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	14 g																				
Realizzazione manto d'usura	18 g																				
Formazione di manto di usura e collegamento	18 g																				
Smobilizzo cantiere	8 g																				
Smobilizzo del cantiere	8 g																				
Segnaletica	8 g																				
Allestimento cantiere	4 g																				
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4 g																				
Realizzazione segnaletica	2 g																				
Posa di segnali stradali	2 g																				
Smobilizzo cantiere	6 g																				

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3		
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Smobilizzo del cantiere	6 g																			
LEGENDA Zona:																				
Z1 = ZONA UNICA																				

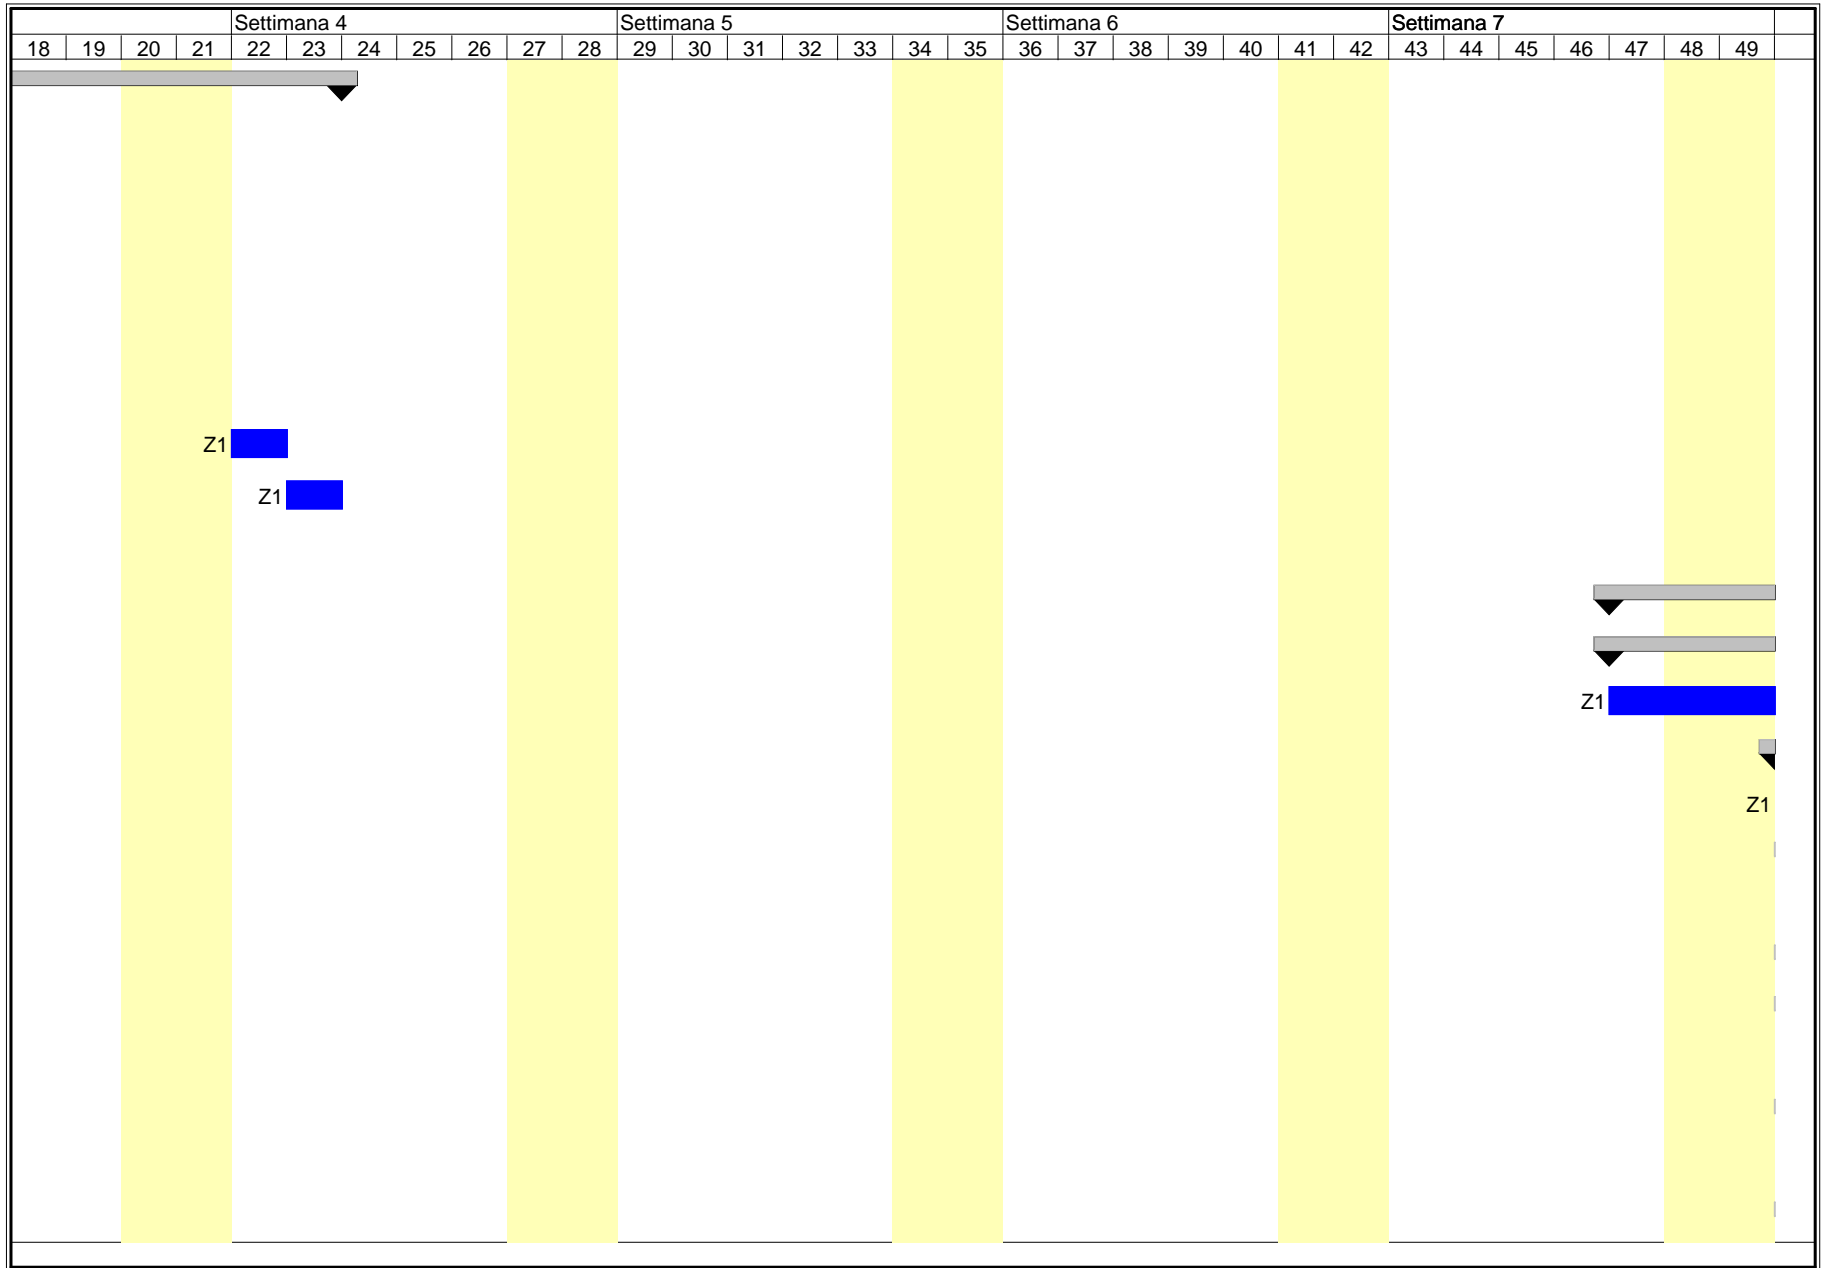

				Settimana 4								Settimana 5								Settimana 6								Settimana 7									
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49						

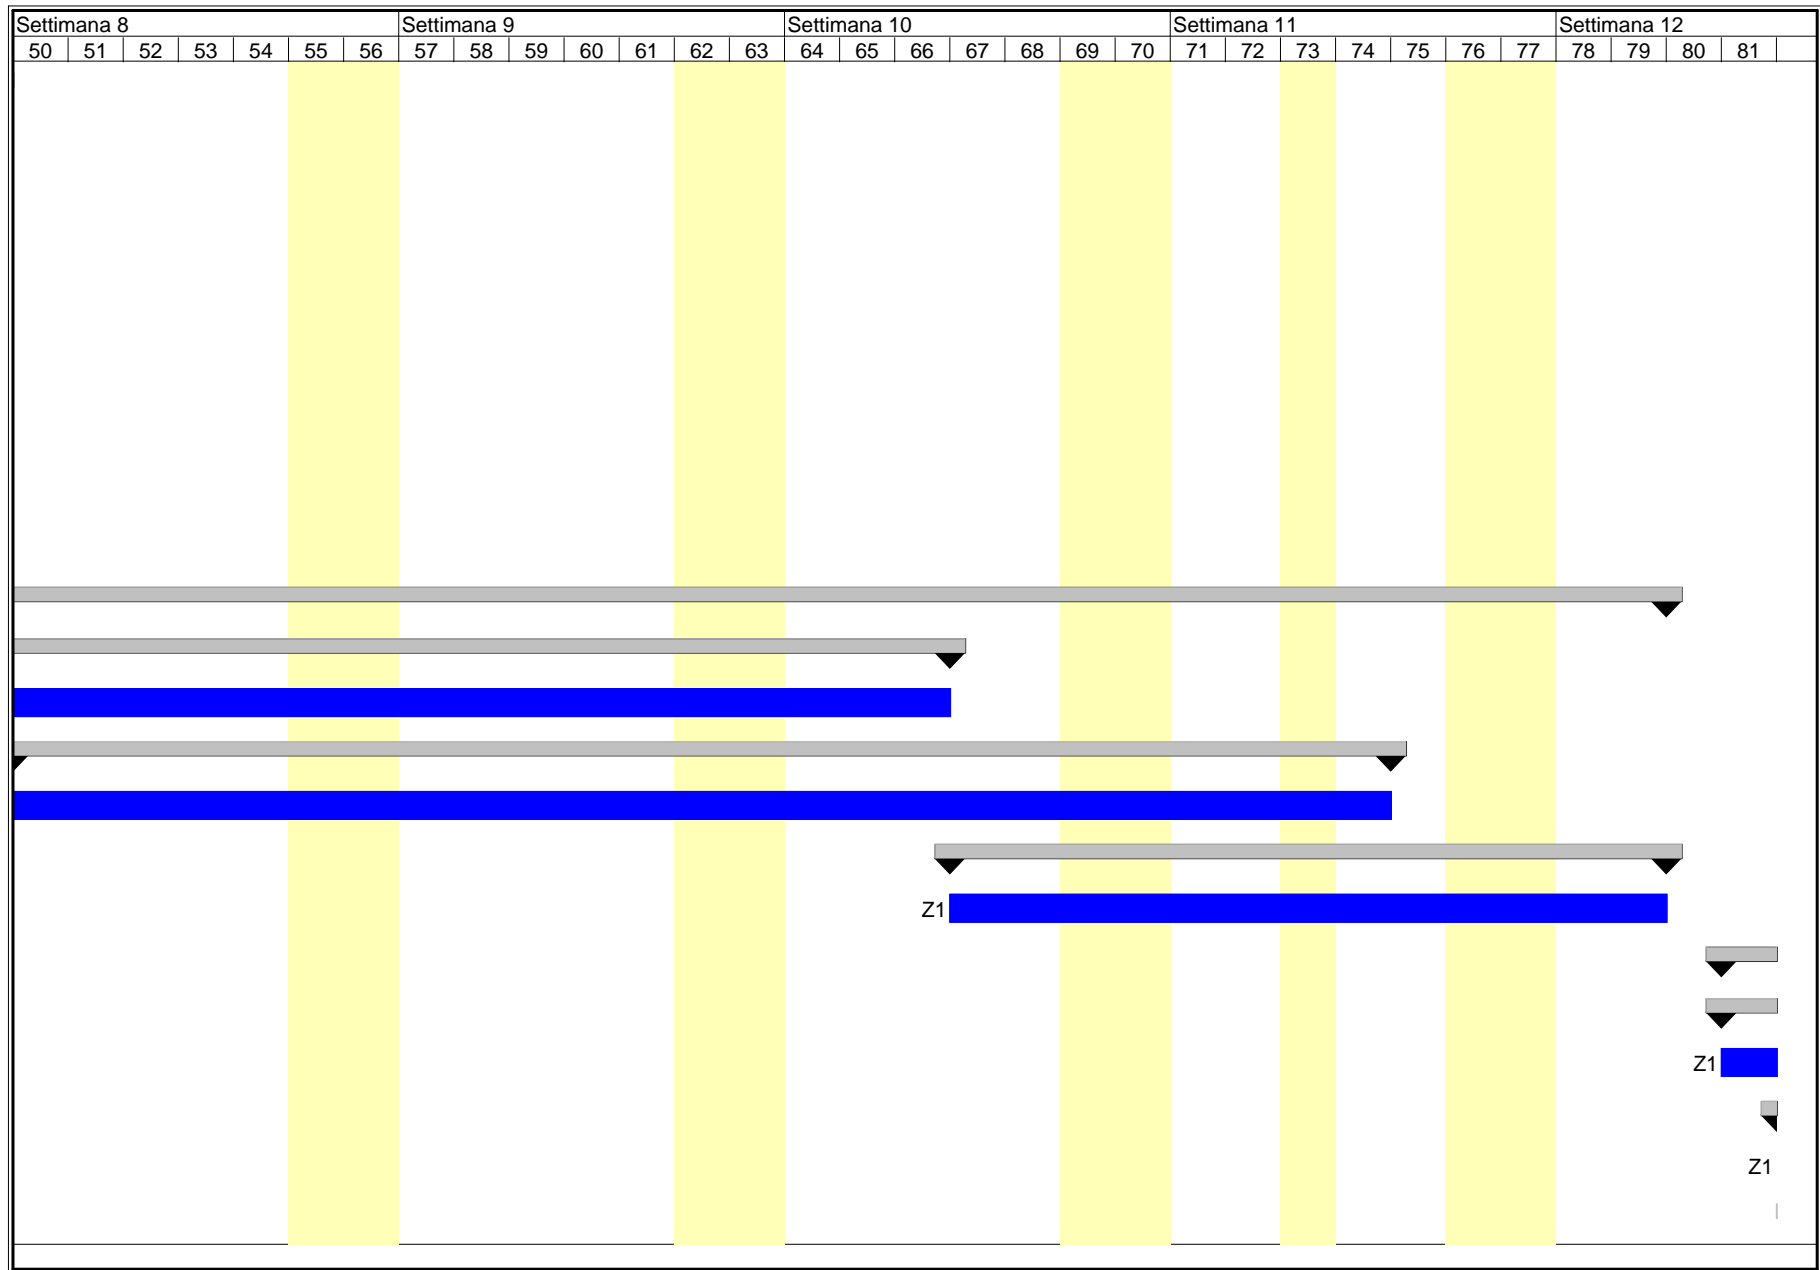

Settimana 8						Settimana 9						Settimana 10						Settimana 11						Settimana 12									
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81		

			Settimana 13							Settimana 14						Settimana 15					Settimana 16					Settim							
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113		
		Z1																															

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GADDEO ANTONIO CONSOLATO

CODICE FISCALE: TINIT-GDDNNC60L31G147F

DATA FIRMA: 07/09/2022 06:38:24

IMPRONTA: 63383130393465346565326564393230656565356662343061633132626462646537303735323966
